


Remodelación de unidad de cuidado intensivo del 4 piso del Hospital Universitario de la Samaritana Cundinamarca

Avance % de la ejecución de actividades del proyecto



Avance % de la ejecución presupuestal del proyecto

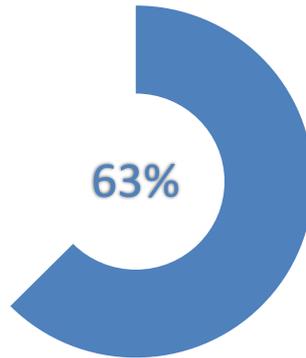

Se adelantaron y culminaron las siguientes actividades de obra

preliminares
mamposteria

Periodo de ejecucion de las fases del proyecto

	2019	2020	2021				
Trimestre de cumplimiento	4	2 4	1	2	3	4	
Metodología General Ajustada							✓
Viabilidad del proyecto							✓
Etapa Contractual							✓
Ejecucion de obra							!

Fase no ejecutada
 Fase en ejecucion
 Fase terminada

Observaciones de la ejecucion

Proyecto radicado	ultima radicacion 25/06/2018
viabilidad tecnica	emitida por el Departamento 28/06/2018 Emitida por La nacion 19/07/2018
Elaborar y perfeccionar contrato	23/12/2019: contrato de obra 786/19 13/01/2020: ACTA DE INICIO 1/04/2020: Suspensión 786/19 31/12/2019: Contrato de interventoria 819/19 13/01/2020: ACTA DE INICIO 1/04/2020: Suspensión 819/19
