



Implementación de una planta de tratamiento de aguas residuales PTAR en el Hospital Universitario de la Samaritana Cundinamarca

Avance % de la ejecución de actividades del proyecto

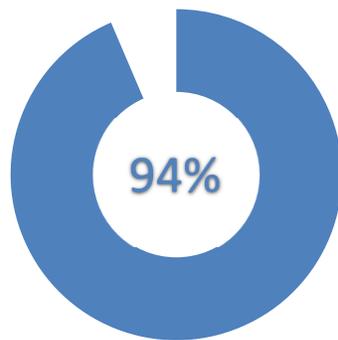

Avance % de la ejecución presupuestal del proyecto

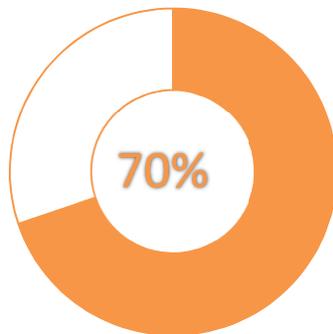

Periodo de ejecucion de las fases del proyecto

	2019	2020		2021			
Trimestre de cumplimiento	4	2	4	1	2	3	4
estudios de ingenieria							
Metodologia General Ajustada							
Viabilidad del proyecto							
Etapa Contractual							
Ejecucion de obra							

-  Fase no ejecutada
-  Fase en ejecucion
-  Fase terminada

Observaciones de la ejecucion

Proyecto radicado	ultima radicacion 27/05/2020
viabilidad tecnica	emitida 10/07/2020
Elaborar y perfeccionar contrato	<p>06/03/2021: contrato 301 del 2021 -04-03-2021 31/08/2021 se realiza adicion y prorroga al contrato 301/2021 03/11/2021 se realiza prorroga contrato 301/2021</p> <p>30/04/2021: contrato interventoria 384/2021 10/11/2021 se realiza prorroga y adicion al contrato 384/2021</p>

Se adelantaron y culminaron las siguientes actividades de obra

- Localizacion y replanteo
- Excavaciones mecanicas
- Fundicion de concretos
- Red conduccion agua residual
- Demolicion y adecuacion area PTAR
- Construccion PTAR
- Instalacion de equipos
- Instalaciones electricas
- Instalacion PTAR
