



Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de 2 ascensores camilleros y un ascensor de carga en la ese Hospital Universitario de la Samaritana

Avance % de la ejecución de actividades del proyecto

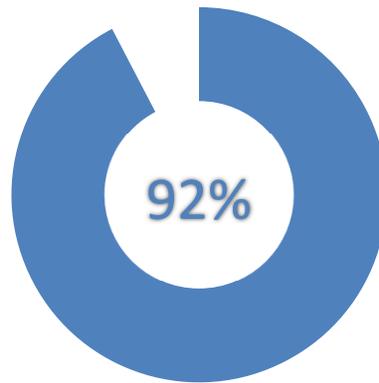

Avance % de la ejecución presupuestal del proyecto

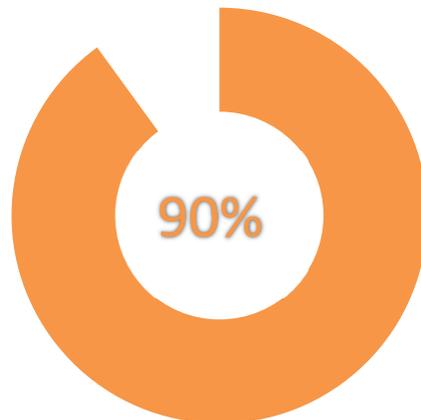

Periodo de ejecucion de las fases del proyecto

	2019	2020	2021				
Trimestre de cumplimiento	4	2 4	1	2	3	4	
Metodologia General Ajustada							✓
Viabilidad del proyecto							✓
Etapa Contractual							✓
Ejecucion de obra							!

 Fase no ejecutada
 Fase en ejecucion
 Fase terminada

Observaciones de la ejecucion

Proyecto radicado	ultima radicacion 03/04/2019
viabilidad tecnica	emitida 14/05/2019
Elaborar y perfeccionar contrato	Contrato de obra 925/2020 ACTA DE INICIO 28 OCTUBRE/2020
llegada de equipos	05/02/2021

Se adelantaron y culminaron las siguientes actividades

Instalacion primer ascensor
 certificacion primer ascensor
 instalacion segundo ascensor
 certificacion segundo ascensor
 instalacion tercer ascensor
 certificacion tercer ascensor
